A construction crane is shown in the background, lifting a large, dark grey silhouette of a house. The house silhouette has a chimney on the left side. The crane's cables are attached to the top corners of the house silhouette, and it is being hoisted upwards. The crane's tower and jib are visible on the right side of the image.

Green Cube  
majatehas

Greencube  
majatehas

Näidispakkumine

# Pakkumine MUST KARP\*

\*pakkumise sisu ja lõplik toode võivad muutuda

## Karkass

- Greencube välismõõdud on **10000mm pikk, 4000mm lai, 4950mm kõrge**
- **Hoone brutopind on 40 ruutmeetrit**
- Greencube kandev konstruktsioon valmistatakse **120mm x 360mm** liimpuittaladele
- Lisakaitse saavutamiseks on liimpuittalad immutatud **Pinotex impraga**
- Konstruktsioonis kasutatav puit on C24 sorteeritud puit
- Greencube on ehitatud aastaringseks kasutamiseks
- **Hoone soojustamiseks on kasutatud energiasäästlikku klaasvilla KNAUF**
  - Välisseina soojustamiseks kasutatakse **200mm klaasvilla**
  - Põranda soojustamiseks kasutatakse **300mm klaasvilla**
  - Siseseina soojustamiseks/müra-õõks kasutatakse **100mm klaasvilla**
  - Vahelae soojustamiseks/müra-õõks kasutatakse **100mm klaasvilla**
  - Katuse soojustamiseks kasutatakse **200mm klaasvilla**
- Hoone tuuletõkke plaadiks kasutatakse **tuuletõkkekipsi**
- Tuuletõkkekips on teibitud, et tagada parim tuuletõkke lahendus
- Hoone alumine perimeeter **on kaitstud näriliste võrguga**
- **HOONE KONSTRUKTSIOONI PAIGALDATAKSE AURUTÕKKEPAPERIT**

## Avatäited

- Aknaraamid on valmistatud plastikust, mis annab aknale pika vastupidavuse  
Aknatootja koduleht: **www.kvaliteetaken.ee**
- Klaasilahenduseks kasutatakse kolmekordseid pakette
- Hoone välisuks on Jeld-wen-i toodang ning turvaliselt lukustatav /välisuks on pruuni värvi
  - *\*Välisukse maksumus kuni 600€*
  - *\*Välisuks peab olema letikaup*

## Väline visuaal

- Hoone katusematerjaliks on kasutatud kvaliteetset **RUUKKI** katusematerjali  
Katus on ehitatud nõuetekohasetl koos tuulutusega. Aluskatteks kasutatakse **Tyvek**-i toodangut
- Voodrilaud **immutatakse (1x)** ja **värvitakse (2x)** (VÄRV:)
- Hoone laudise profiil on **UYV.21X120X (kuusk või mänd)**
- Hoone räästakast ja piirded **immutatakse (1x)** ja **värvitakse (2x)** (VÄRV:)
- Hoonel on kliendi poolt valitud värvi **RUUKKI** ääreplekid (must)

# Pakkumine SISEVIIMISTLUS\*

\*pakkumise sisu ja lõplik toode võivad muutuda

- Pakkumises olevaid materjale on võimalik vahetada vastavalt kliendi soovile. Juhul kui soovite mõnda materjali (ker.plaadid, parkett, värv vms) asendada peate materjali tarnima 2nädala jooksul Greencube tehasesse. Pakkumises arvestatud materjali maksumus arvestatakse viimasest osamaksest maha!
- NB! Mõne materjali paigaldus võib olla oluliselt kulukam kui pakkumises arvestatud materjali paigaldus!

## ÜLDINE

- Hoones kasutatavad liistud on puitliistud ja sobilikud valitud materjalidega
- Hoones kasutatavad ukсед on puituksed või samaväärsed
- **WC/Pesuruumi uks on 8x21 männi siseuks.** Mis on kaetud akrüülvärviga  
Uksel on kasutatud kroom WC-ukse mooduleid ja uks on seest lukustatav
- Ehitaja võtab õiguse paigaldada tehnosõlmedele ligipääsemiseks vajalikke tehnoluuke

## ELUTUBA

- Seinakattematerjaliks kasutatakse puitlaudist
- Puitlaudis kaetakse valge seinavahaga või pinotexiga (2 kiht)
- **Põranda kattematerjaliks kasutatakse laudparketti**  
Kuni 40€m<sup>2</sup>
- Laekattematerjaliks kasutatakse laudist

## MAGAMISTUBA

- Seinakattematerjaliks kasutatakse puitlaudist
- Puitlaudis kaetakse valge seinavahaga või pinotexiga (2 kiht)
- **Põranda kattematerjaliks kasutatakse laudparketti**  
Kuni 40€m<sup>2</sup>
- Laekattematerjaliks kasutatakse laudist

## WC/VANNITUBA

- **Pesuruumis olevad seinad ja põrand plaaditakse**

Plaadi ruutmeetri maksumus kuni 20€+km. Plaat peab olema kättesaadav 7tp jooksul.

Plaatimisel on arvestatud kas 30x60cm või 60x60cm plaadiga. Erimõõdus plaatide plaatimisel arvestatakse plaatimine tunnitöö alusel. 30€+km tund.

- Laekattematerjaliks kasutatakse laudist.
- Wc-pottiks kasutatakse **A-collection** wc pott-i (allajooks). Koos vaikselt sulguva kaanega
- Kvaliteetne **Hansgrohe** (või samaväärne) vannisegisti koos duššiliftiga
- Vannitoas on väike valamu **Hansgrohe** (või samaväärne) koos kvaliteetse **Hansgrohe** (või samaväärne) segistiga
- Pesuruumi põrandas on piklik trapp

## Elektritööd

- **Hoones on LED valgussüsteem**

- **Hoone ette paigaldatakse hämaras süttivad LED valgustid**

- Hoonesse tuleb süvistatav el.kilp

Hoones kasutatavad automaadid on **CHINT toodang**

- **Pesuruumi põrandasse paigaldatakse põrandaküte.** +Programmeeritav termostaat

- **Hoones on kokku 35 pistikupesa. Pistikupesade asukoht ja kõrgused valib klient**

Klient peab pistikupesade asukohad (s.h modemite/ruuterite jne asukohad) edastama enne ehitustööde algust

Vastasel juhul paigaldab ja valib pistikute asukohad ehitaja

- Kõik hoones kasutatavad pistikud ja lülitid on **VIKO** (või samaväärse) toodang
  - Kõik kasutatavad lülitid ja pistikud on valget värvi
  - Hoone ühendus el. võrguga toimub võimalusel otse kilpi
- Voolu tugevuse peab tellija täpsustama enne ehituse algust

**NB: Hoone ühendamise ei ole pakkumise osa!**

- 2x pistik väljas voolu saamiseks

## Ventilatsioon

- Hoone WC/pesuruumi on paigaldatud sundventilaator  
Ventilaator hakkab tööle koos WC/pesuruumis oleva valgustiga
- Hoones on **1tk -5c fresh klapp**

## Torutööd

- Hoones on teostatud seinasisesed torutööd
- **Torutöödeks kasutatakse 16" UPONOR toru**
- Hoone veeühendus toimub läbi **32mm PEM toru**
- PEM torru on paigaldatud küttekaabel **4M**
- Hoones on pesumasina valmidus
- **Hoonel on külmumiskindel välikraan**
- Hoones on 50L boiler. Boiler asub wc poti kohal
- Veesõlme juurde pääseb läbi tehnoluugi
- Hoones ei ole veefiltrit
- Hoones ei ole veemõõtjat

## Küttelahendus

- Hoone kütelahendus on lahendatud **Mitsubishi Electric LN 25** õhk-õhk pumbaga

## Transport

- Hooned on transportimisel **pakitud ilmastikukindlalt** ja omavad **veosekindlustust**
- Hooneid transportib **SINTRAVELLA**

**Asukoht: Täpsustatakse enne transporti**


## Vundament

- Greencube teostab vundamendiga seotud tööd (postvundament)
  - Vundamendi ehitus ei hõlma täitematerjale
  - Vundamendi ehitus ei hõlma pinnase planeerimist

# Märkused!

## Lisa:

Soojapidav sein ja põrandalahendus

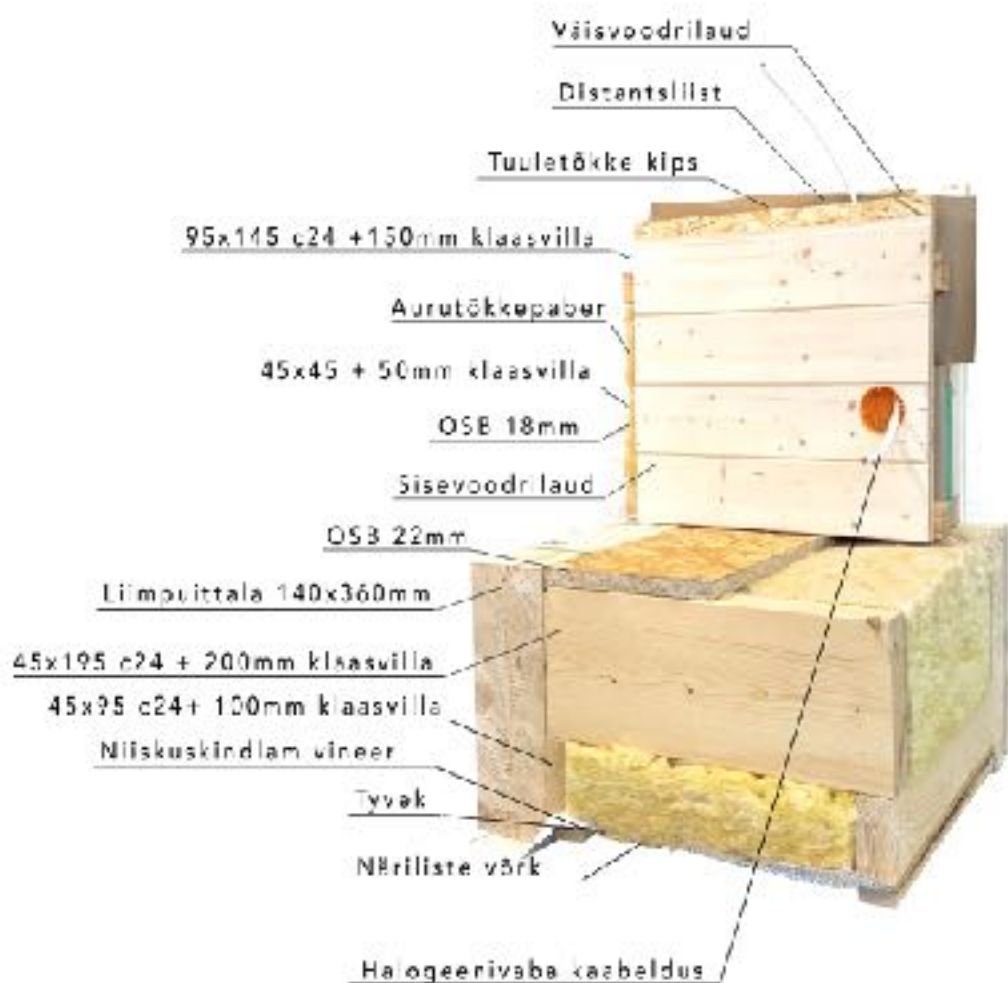



# Aastate pikkune kvaliteet

**Greencube** oü-d on tunnustatud nii Eestis kui ka rahvusvahelises meedias.

Tähelepanu oleme pälvinud väga hea hinna ja kvaliteediga.

Lisaks võitis **Greencube** OÜ 2016a "Parima aiamaja tiitli", ning on pääsenud oma innovaatilise majalahendusega ka **Ajajahi top 30**-ne sekka.

Greencube oü panustab palju, et ettevõttes töötav tööjõud oleks pädev ning koolitatud. Koolitatud tööjõud tagab õiged töövõtted ning suurepärase kvaliteedi.



**Greencube** majatehas on kiirelt kogunud suure fännibaasi.

Facebookis on meil üle **31 700** jälgija! Mis on väga märkimisväärne tulemus!

**Täname kõiki praeguseid ja tulevasi fänne!**





# Kvaliteetsed materjalid ja tööriistad.

Greencube kasutab ainult kvaliteetseid materjale ja tööriistu.

## Kinnitusvahendid

- Würth
- Senco

## Töövahendid

- Makita
- Senco

## Ehituskeemia

- Penosil
- Makroflex

## Puitmaterjal

- Puumarket

## Ehituslikud segud

- Mira
- Uninaks
- Sakret
- Weber

## Üldehitusmaterjalid

- Bauhof
- Ehituse ABC
- Espak
- Decora

## Hoolikalt valitud partnerid



# Tehtud tööd

Varasemalt Greencube OÜ poolt teostatud tööd.



# Greencube hinnastamine

- Tabelis nähtavaid artikleid on võimalik Tellijal eemaldada enne lepingu allkirjastamist
- Tabelist nähtavad maksumused võivad muutuda

Greencube MUST KARP erilahendus	Kogus (tk)	Ühiku hind	Kokku (km-ta)
Karkass	1	€ 17 700	€ 17 700
Teine korrus	0	€ 8 900	€ 0
Avatäited	1	€ 3 450	€ 3 450
Väline visuaal	1	€ 11 990	€ 11 990
<b>Kokku km-ta</b>			<b>€ 33 140</b>

Pakkumine Siseviimistlus	Kogus (tk)	Ühiku hind	Kokku (km-ta)
Siseviimistlus üldine	1	€ 1 850	€ 1 850
Siseviimistlus elutuba	1	€ 4 190	€ 4 190
Viimistlus 2.korris	0	€ 3 110	€ 0
Siseviimistlus magamistuba	1	€ 3 100	€ 3 100
Siseviimistlus WC/vannituba	1	€ 3 190	€ 3 190
Elektritööd (ilma kodusmaanduse, akti ja projektita)	1	€ 2 100	€ 2 100
Ventilatsiooni süsteem (koos paigaldusega)	1	€ 450	€ 450
Torutööd (uponor)	1	€ 1 200	€ 1 200
Küttelahendus (mitsubishi electric In 25) *	1	€ 1 990	€ 1 990
Vundamendi tööd (postvundament)	1	€ 2 200	€ 2 200
<b>Kokku km-ta</b>			<b>€ 20 270</b>

Greencube LISA	Kogus (tk)	Ühiku hind	Kokku (km-ta)
Elektritööde kordusmaandus, akt ja projekt *	1	€ 1 330	€ 1 330
Eelprojekt *	1	€ 1 500	€ 1 500
Geoalus *	1	€ 690	€ 690
EZVIZ kaamerad 4tk	0	€ 800	€ 0
Kamina valmidus	0	€ 150	€ 0
<b>Premium plus</b> hoolduspakett (12kuud lisagarantiid ehitustöödele)	0	€ 1 300	€ 0
<b>Kokku km-ta</b>			<b>€ 3 520</b>

Kirjeldus	Kogus (tk)	Kokku (km-ta)
<b>Greencube</b> erilahendus must karp	1	€ 33 140
<b>Greencube</b> erilahendus siseviimistlus	1	€ 20 270
<b>Greencube</b> erilahendus lisavarustus	1	€ 3 520
<b>Kokku km-ta</b>		€ 56 930
<b>Kokku km-ga</b>		<b>€ 69 454.60</b>

\* Kuna Greencube oü ostab teenusena sisse elektriprojekti/akti, eelprojekti, geodeesia ja näiteks ka septiku (jne) paigaldusega seotud tööd. Siis ei saa Greencube OÜ võtta vastutust nende teenuste kiiruse ja kvaliteedi eest!

## TASUMINE:

Hoone maksumus tasutakse **kahe** osamaksega.

- Esimene osamakse 70% tasutakse enne ehitustööde algust
- Teine osamakse 30% tasutakse siis kui hoone on tootmises valmis transportimiseks/paigaldamiseks

## TRANSPORT:

- Kui hoone on tehases transpordiks valmis, on Tellijal kohustus tulla Greencube oü tootmisesse ning veenduda hoone valmiduses. Kui märgatakse puudusi siis on Tellijal kohustus nendest ehitajat teavitada enne transporti.
- Hoone transpordi maksumus lisandub lõpphinnale avatud kalkulatsiooni näol!  
Transport ja selle maksumus sisaldab:
  1. Transpordiks vajalike sõidukite ja/või kraana sõit tootmisesse
  2. Hoone ja/või elementide ning materjalide laadimistööd tootmises
  3. Hoone ja/või elementide ning materjalide transport sihtkohta
    1. Vajadusel lisanduvad: saateauto(d) eriveose load.
    2. Väga harva lisandub ka autojuhi majutus (üldiselt saared, transpordid mis kestavad rohkem kui kaheksa töötundi
  4. Hoone ja/või elementide ning materjalide laadimis ja monteerimistööd objektil
  5. Transpordi töid teostanud sõidukite naasmine (nende) staapi

## TÄHELEPANU:

### GREENCUBE OÜ EI VASTUTA KOLMANDATE OSAPOOLTE POOLT TEHTUD TÖÖDE KIIRUSE JA KVALUEEDI EEST.

Kuna Greencube oü ostab teenusena sisse näiteks elektriprojekti/akti, eelprojekti, geodeesia töid siis ei saa Greencube OÜ võtta vastutust nende teenuste kiiruse eest!

Pakkumine ei ole edastamiseks kolmandale osapoolle ning kõik edastatud joonised/visuaalid kuuluvad Greencube OÜ-le!

# Premium plus hoolduspakett

Premium plus hoolduspakett on maja täiendhooldus, mis viiakse läbi 12-24 kuud peale objekti lõpetamist. Täiendhooldus viiakse läbi täpseid juhiseid järgides ning eesmärgiks on hoone loomuliku eluea pikendamine. Lisaks kaasneb Premium plus paketiga 12-kuuline lisagarantii ehitustöödele.

## Pakett sisaldab

- Hoone välisviimistluse parandustöid ja värvimist
- Katuse materjali kontrolli ja hooldust
- Vihmavee süsteemi kontrolli, hooldust ja puhastust
- Torutööde kontrolli, hooldust ja puhastust
- Siseviimistluse parandustöid
- Terassi parandustöid, värvimist
- Elektritööde kontrolli/hooldus ja parandust
- Avatäidete reguleerimist, kontrolli ja hooldust
- Ventilatsiooni süsteemi kontrolli ja puhastust

## Pakkumine ei sisalda:

- Ehitus- ja kasutusloa taotlemist
- Ehitusprojekti ja/või eelprojekti
- Elektriprojekti ja/või mõõdistamisakti
- Riigilõive ja muid võimalikke tasusid projekti kooskõlastamisel ja lubade taotlemisel
- Juurdepääsutee ehitust
- Puitpindade välisviimistlus ei sisalda terrassilaudade värvimist/õlitust
- Puitpindade välisviimistlusel on arvestatud läbikumava värviga. Katva värvi puhul võib hind muutuda
- Välisuste lävepakkude laiendeid (paigaldatakse peale põrandakatte paigaldust)
- Sahtide ja kommunikatsiooni teede ehitust
- Piksekaitsesüsteemi
- Objekti valvet töövälisel ajal
- Ajutist ja alalist piirdeaeda
- Ehitusele eelnevat ja sellele järgnevat geodeetilist mõõdistust
- Ehitusobjekti prügivedu ja koristust
- **Kommunikatsioonidega ühendamist (vesi, elekter, reovesi)**

## Lisatööd

Kõik lisatööd, näiteks kommunikatsioonidega ühendamised, arvestatakse avatud kalkulatsiooniga. Kalkulatsiooni aluseks on materjali maksumus + 30€/km töömehe töötund.

---

# Koostööle lootma jäädes,

Rico Saadre

+(372) 5638 3789
